

## Valkealan monitoimitalo 17.5.2023

**Työmaan vahvuus:** 59 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Maalaustyöt ( porraskäytävät ja kotelot)
- Kalusteväliäen laatoitus
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla, sähkökalustuksella sekä konehuoneiden sähköasennuksilla
- Alakattorungot, tekniikkalevyasennukset sekä alakattojen ummistus
- Kiintokalusteasennus lohossa C
- LVV-kalustus
- Verhokiskoasennus
- Loppusiivous
- Varusteasennus
- Listoitus
- Julkisivun maalaus
- Lukitukset ja heloitukset
- Pihakiviasennus
- Päiväkodin leikkivälineasennus
- Asfalttipohjien maanrakennus
- Aurinkosähköjärjestelmän asennus vesikatolle

**Pääosin valmistuneita työvaiheita:**

- Välioviasennus
- Kattoterassin lattia


**Työturvallisuus:**

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,91%

**Muuta tiedotettavaa:**

- Pohjoispihalla, vanhan nykyisen koulun piha-alueella alkaa pysäköintialueen maanrakennustyöt 5.6.2023

**5.6.2023 alkaa alla olevan kuvan mukainen pysäköintialueen maanrakennus, jolloin ko. alue on suljettu työmaa.aidoin**

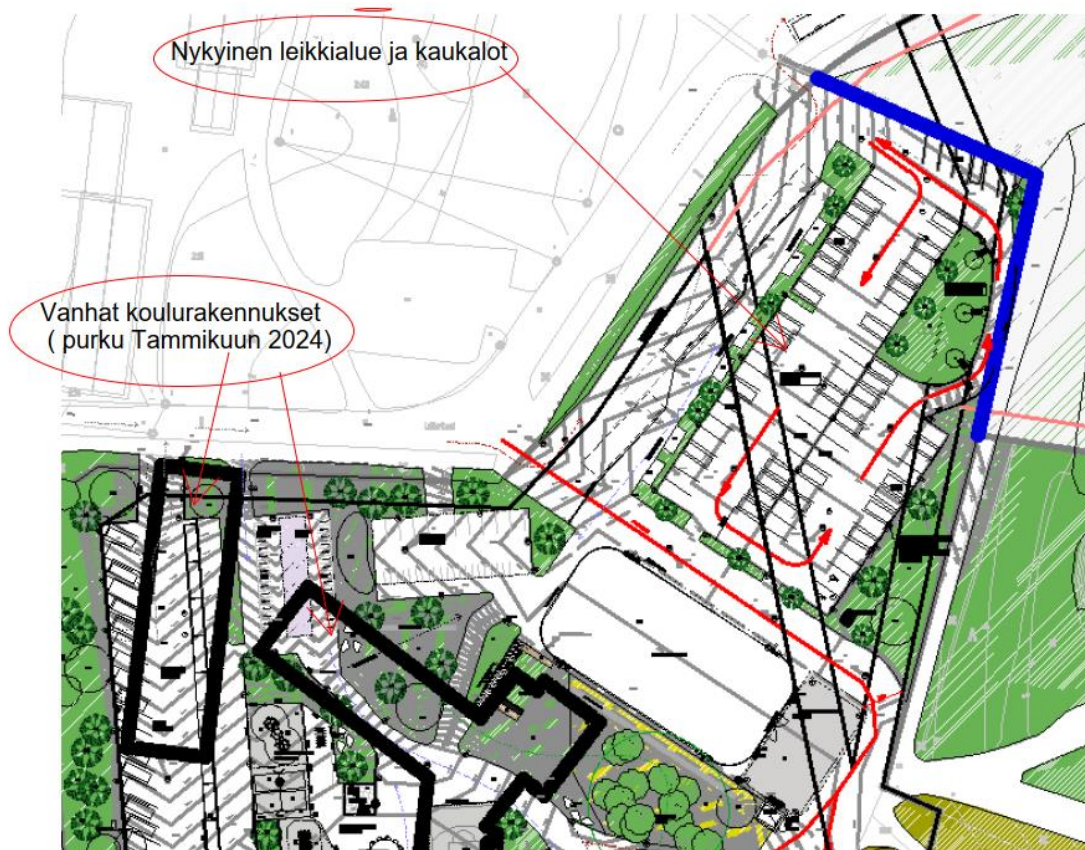

**Tulevan pysäköintialueen maanrakennus tälle alueelle**



***Päiväkodin leikkivälineitä sekä aita-asennusta***



