

## Valkealan monitoimitalo 19.10.2022

**Työmaan vahvuus:** 70 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti


**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Eteläpäädyn maanrakennus, aluesähköistys ja sadevesiputkitukset
- Julkisivuverhoukset jatkuu lastauslaiturilla sekä sisäänkäynneissä
- LV-asennukset koko talossa ( vesi ja lämpöjohtoasennus)
- Pintabetonilattiatyöt valmiit
- IV-kanava-asennukset kellarissa, kirjastossa sekä iv-konehuoneessa
- Kipsiväliseinätyöt lohkoissa B ja C
- Tasoite- ja maalaustyöt väliseinätöiden perässä
- Seinä ja lattialaatoitus lohkoissa A
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla sekä johtoreitti asennuksilla
- Näyttämön lattiarakennetyöt
- 

### *Eteläpihan imeytysrakenne*



*Pääsisäänkäynnin puutyöt käynnissä*

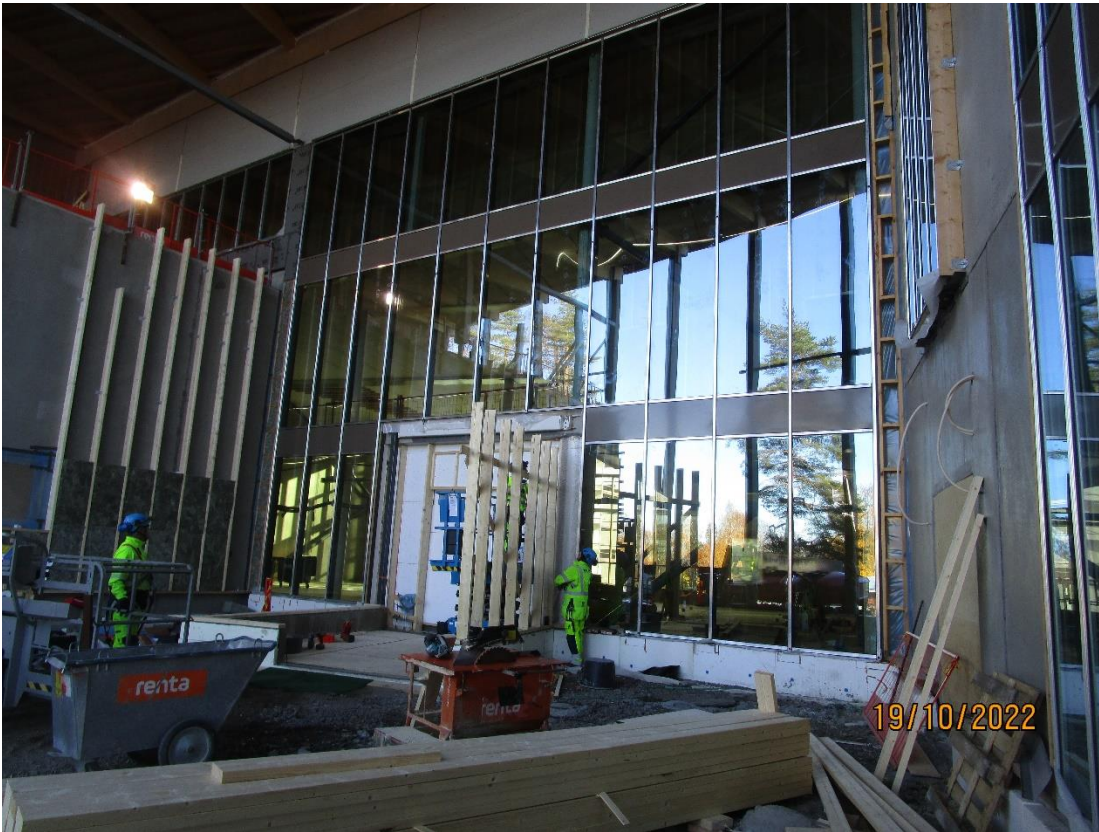

*Fy-Ke tiloissa väliseinätyö alkamassa*



**Näkymä kirjastosta**



**Ruokalatila ja 2-kerroksessa hallintotilat**

**Työturvallisuus:** Työturvallisuuden TR-mittaus 13.10.2022 => 97,67%
