

## Valkealan monitoimitalo 17.2.2023

**Työmaan vahvuus:** 58 henkilöä

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Piharakennusten puurakennetyöt
- LV-asennukset koko talossa ( vesi ja lämpöjohtoasennus)
- Kaukolämpövaihtimen asennus
- IV-kanava-asennukset kerroksissa
- Tasoite- ja maalaustyöt porraskäytävissä
- Seinä ja lattialaatoitus B-C lohkoissa
- Sähköasennukset jatkuu mm. väliseinäkaapeloinneilla, johtoreitti asennuksilla, paloilmaisin asennuksilla ja sähkökalustuksella
- Alakattorungot ja tekniikkalevyasennukset
- Lattiapinnoitukset lohkossa B
- Kiintokalusteasennus lohkossa A
- Kattoterassin lattiatyöt
- Välioviasennus
- Puusisäikkuna asennus
- Sisäänkäynnin A teräsporrasasennus
- Liikuntasalin hätäpoistumisluiskan asennus


**Alkavat työvaiheet:**

- Keittiölaitteet vk 9
- Hissi vk 9

**Työturvallisuus:**

- Turvallisuusmittausten keskiarvo 96,95%

*"Miltä hyvä näyttää" => turvallisuushavainto kulku ja poistumis reitistä*

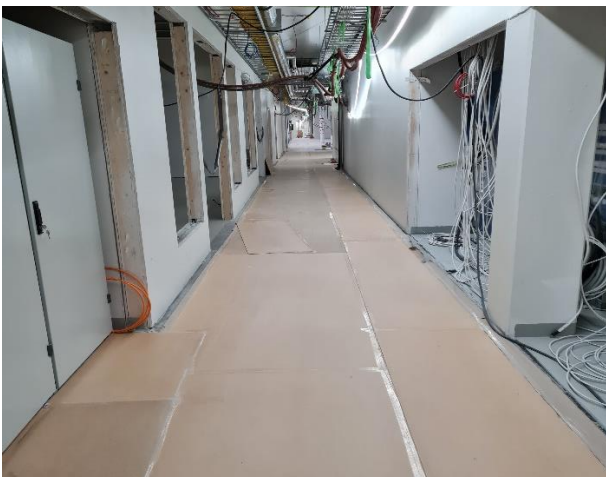

*Sisäänkäyntiportaat eteläpääty*



*Päiväkodin kalusteita*





Sisäovi ja ikkuna asennuksia

