

## Valkealan monitoimitalo 31.3.2022


**Työmaan vahvuus:** YIT Suomi Oy: 5 toimihenkilöä, 8 rakennusammattimiestä  
Aliurakoitsijat: 20-30

**Aikataulu tilanne:** Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

**Käynnissä olevat työvaiheet:**

- Elementtiasennus 2-3 kerroksissa ( elementtiasennus jatkuu 5-2022 asti)
- Höyrynsulkuasennus yläpohjaan sekä vesikaton vedeneristystyöt
- Vss-asennus lohko C
- Vesikaton puutyöt
- Väliseinämuuraus 1 krs
- Katosten anturatyöt lohko A

### Elementtiasennus lohko C

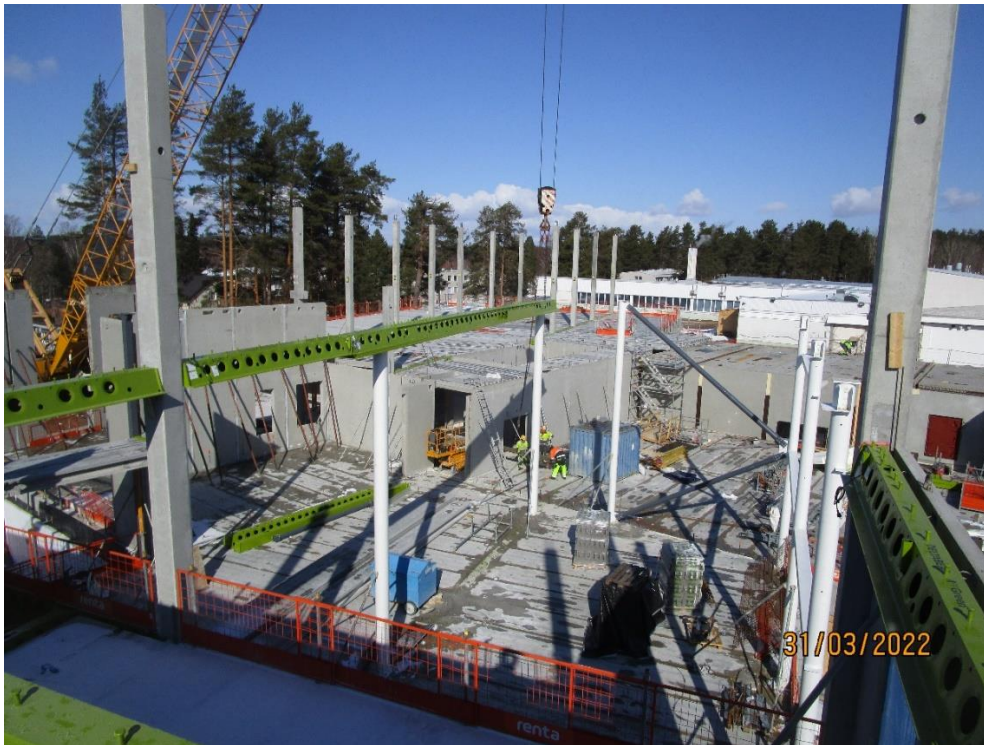

Sisäkuva päiväkodista



Väliseinämuuraukset päiväkodissa



- Alkavat työvaiheet:** Talotekniikkatyöt, liimapurakenteiden asennus katoksiin ja pintabetonilattiat
- Työturvallisuus:** Työturvallisuus mittausten keskiarvo 97,1% ( max 100%)  
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 155 kpl 31.3.2022 mennessä
- Laatuasiat:** Kosteudenhallintakoordinaattorin työmaatarkastus 30.3.2022
