

Valkealan monitoimitalon tilannekatsaus 26.10.2021

Työmaan vahvuus: YIT Suomi Oy: 4 toimitiehenkilöä, 3 rakennusammattimiestä
Aliurakoitsijat: 5

Aikataulu tilanne: Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maanrakennustyö jatkuu anturapohjien täyttötöyönä sekä salaoja-asennuksilla
- Perustusten laudoitus, raudoitus ja valutyöt

kuva työmaalta 26.10.2021:



Havainnekuva tulevasta:




Tulevat tapahtumat: Peruskiven muuraus 5.11.2021

Alkavat työvaiheet: Autonosturin kasaus työmaalla vk 44-2021

Elementtiasennus vk 45-2021

Vss-asennus kellariin vk 47-2021

Elementtiautojen ajoreitit

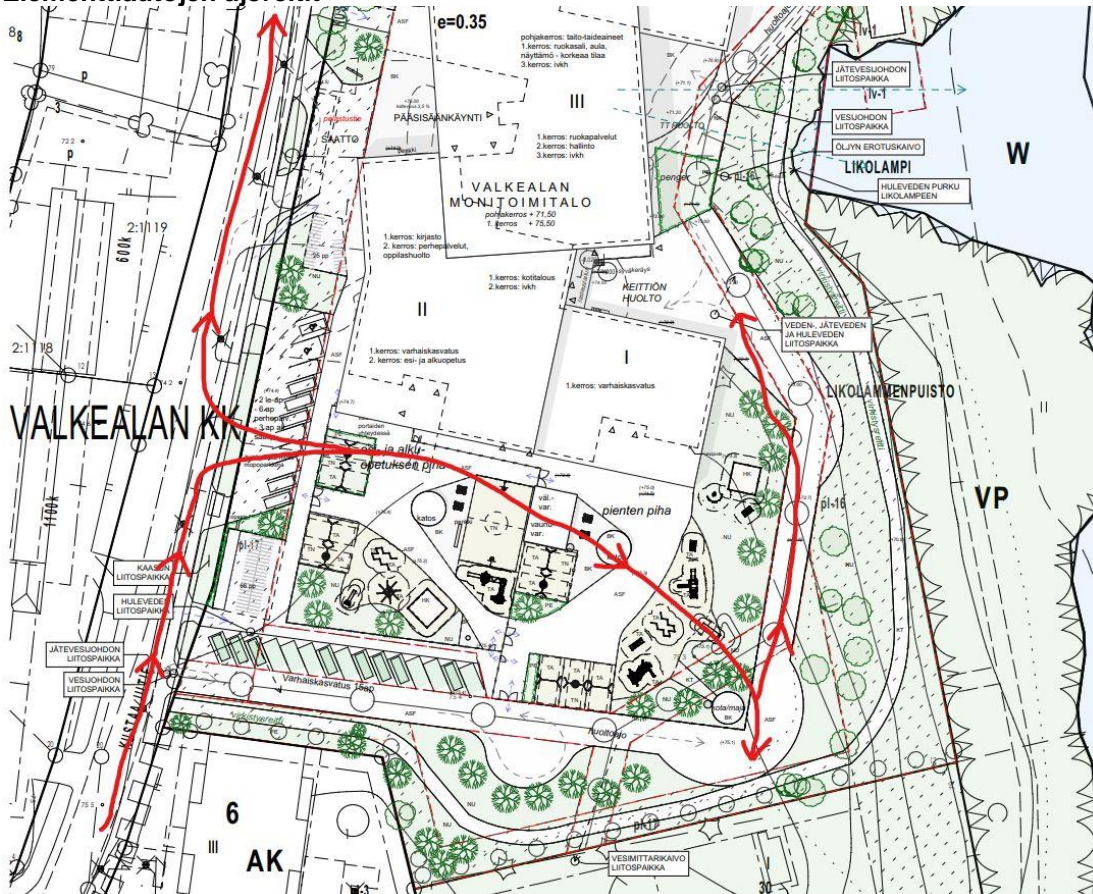

Työturvallisuus:

Työturvallisuus mittausten keskiarvo 96,85 % (max 100%)
Ei tapaturmia eikä läheltä piti tilanteita
Tehtyjä turvallisuushavaintoja 49 kpl 26.10.2021 mennessä
