


Työmaan kuukausitiedote 07/2021

Nauriskasken koulun työmaa

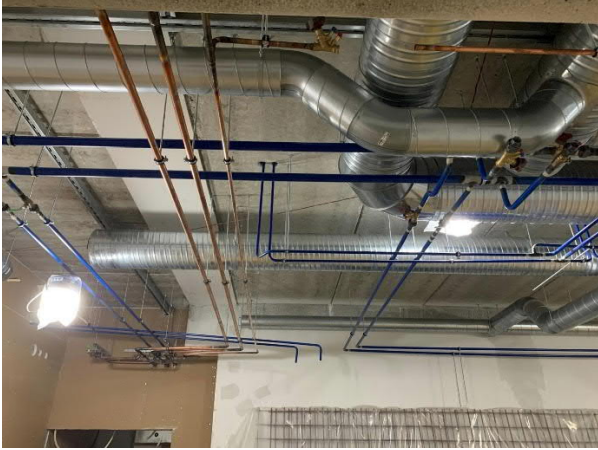

Kuvassa talotekniikka-asennuksia.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Maanrakennustyöt jatkuvat pihojen pohjatöiden viimeistelyillä. Varsinaiset pihatyöt ja aitojen asennukset alkavat syksyllä.
- Vesikaton pintakermin asennus on käynnissä.
- Julkisivun levyverhoustyö on loppusuoralla. Julkisivun lasiseinätyöt ovat alkamassa.
- Sisävalmistusvaiheen työt ovat käynnissä. Viimeiset pintalattiat valetaan elokuun aikana ja kipsilevyväliseiniä teko on käynnissä. Tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä.
- Hissin asennus on alkamassa.
- Talotekniikkatyöt etenevät kovalla vauhdilla talon sisäpuolella joka kerroksessa.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella työmaan loppuun asti.
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla suljettu hetkellisesti esim. pitkien rekkojen kääntyessä työmaalle ja työmaalta pois. Liikenteen sulkemisen aikana on tarvittaessa liikenteen ohjaus.
- Espoon kaupunki rakentaa koulutyömaan edustalla Kaskihaka katua. Siitä voi aiheutua häiriötä etenkin työmaan ohi kulkeville jalankulkijoille.

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja
mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279
